

# Oprava opěrné zdi a mostku v ul. Ke Koupališti

## na pozemcích p.p.č. 1017/15, 1017/18, 1017/32 v k.ú. Velká Ledhujka

Stav: 29.09.2025 předání staveniště

Termín dokončení: **28. 11. 2025 (dle smlouvy o dílo č. SML/2025/44), 4. 3. 2026 (zábradlí dle objednávky č. OBJ/2026/2)**

Zhotovitel: **SVOBODA 24 SMF s.r.o., IČ: 03892743**  
**KAVA-KOVO s.r.o., IČ: 07891181 (zábradlí)**

Sídlo: Hlavňov 24, 549 54 Police nad Metují

Cena dle CN: 980.306,18 Kč včetně DPH  
Skutečná cena: 980.306,18 včetně DPH + 79.376 Kč včetně DPH (zábradlí) =  
**1.059.682,18 Kč včetně DPH**

Foto:



**Obr. 1** – - Realizace betonových základů nové opěrné zdi na levém břehu vodního toku Ledhujka v blízkosti silničního mostku v ul. Ke Koupališti

# Oprava opěrné zdi a mostku v ul. Ke Koupališti

## na pozemcích p.p.č. 1017/15, 1017/18, 1017/32 v k.ú. Velká Ledhuje

### Popis a specifikace záměru/zakázky:

Obsahem zakázky je oprava opěrné zdi, která je v havarijním stavu, opravy mostních opěr a nové zábradlí na mostku viz. projektová dokumentace v příloze. Dle hlavní mostní prohlídky je krajní levobřežní mostní podpěra degradována, přibetonovaný líc je v celé délce podemletý, cca 20-30 cm na výšku odpadlý vymletý beton, líc je zvětřalý, obnažené kamenné zdivo pod vymletým betonem s vymletými spárami kameny uložené volně na sebe a lokálně zakořeněnou vegetací. Vlevo před mostem v oblasti nad sesutým křídlem strmě kolmá utržená a popraskaná krajnice = nebezpečná kolizní oblast - hrozí sesutí včetně konstrukčních vrstev vozovky.

Stávající opěrná zeď byla vybourána a na jejím místě byla postavena nová železobetonová s ocelovou výztuží a železobetonovým základem. Za zdí byla provedena drenáž DN 125, položena filtrační a separační geotextilie se zásypem z drceného kameniva. Před železobetonovou zdí byla vybudována nová pohledová zeď z božanovského pískovce.

Na stávající podkladní vrstvy komunikace byla položena vyrovnávací vrstva z kameniva tl. 80 mm, betonová stabilizace tl. 120 mm a asfaltová vrstva tl. 100 mm.

Součástí cenové nabídky bylo i zajištění uzavírky komunikace a dopravního značení.

Stavební práce na základě výsledku poptávkového řízení realizovala obchodní společnost SVOBODA 24 SMF s.r.o., IČ: 03892743, sídlem Hlavňov 24, 549 54 Police nad Metují.

Nové kovové zábradlí typ MK-1 s protikorozní ochranou (žárové zinkování) v barevném provedení olivová šedá (RAL 7002) vyrobila firma KAVA-KOVO s.r.o., IČ: 07891181, sídlem Řešetova Lhota č.p. 34, 547 01 Náchod. Montáž zábradlí na chemické kotvy provedla tatáž firma.

Informace o prováděných rekonstrukcích vybraných místních komunikací je možné zhlédnout na webových stránkách města:

[www.policenm.cz](http://www.policenm.cz) , v sekci Rozvoj města: [https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice a údržba/](https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice-a-udrzba/).

Náklady na provedení zakázky (opěrné zdi) činily 810.170,40 Kč bez DPH, tj. 980.306,18 Kč včetně DPH.

Kovové zábradlí, které bylo provedeno dodatečně na objednávku: 79.376 Kč včetně DPH

Náklady celkem: **1.059.682,18 Kč včetně DPH.**

Dokončení zakázky: 28. 11. 2025; dokončení zábradlí 4. 3. 2026.

**Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:**

Za firmu SVOBODA 24 SMF s.r.o.:

František Svoboda

mobil: 602 884 911

e-mail: ---

Za firmu KAVA-KOVO s.r.o.:

Tomáš Káva

mobil: 604 900 497

e-mail: [kava.t@centrum.cz](mailto:kava.t@centrum.cz)

Za město Police nad Metují:

Radek Starý, místostarosta

mob.: 603 998 654

e-mail: [stary@policenm.cz](mailto:stary@policenm.cz)

Ing. Dušan Šedek, investiční technik

mob.: 724 268 333

e-mail: [sedek@policenm.cz](mailto:sedek@policenm.cz)

Děkujeme za Vaši vstřícnost a trpělivost při realizaci,


město Police nad Metují, Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

**Obr. 2a, 2b** – opěrná zeď na levém břehu vodního toku Ledhujka na pozemku p.p.č. 1017/15 v k.ú. Velká Ledhujka – v pozadí vozovka na ulici Ke Koupališti, září 2021



Obr. 3 – Návh – řez opěrnou zdí

## Opěrné zdivo vč. opravy komunikace

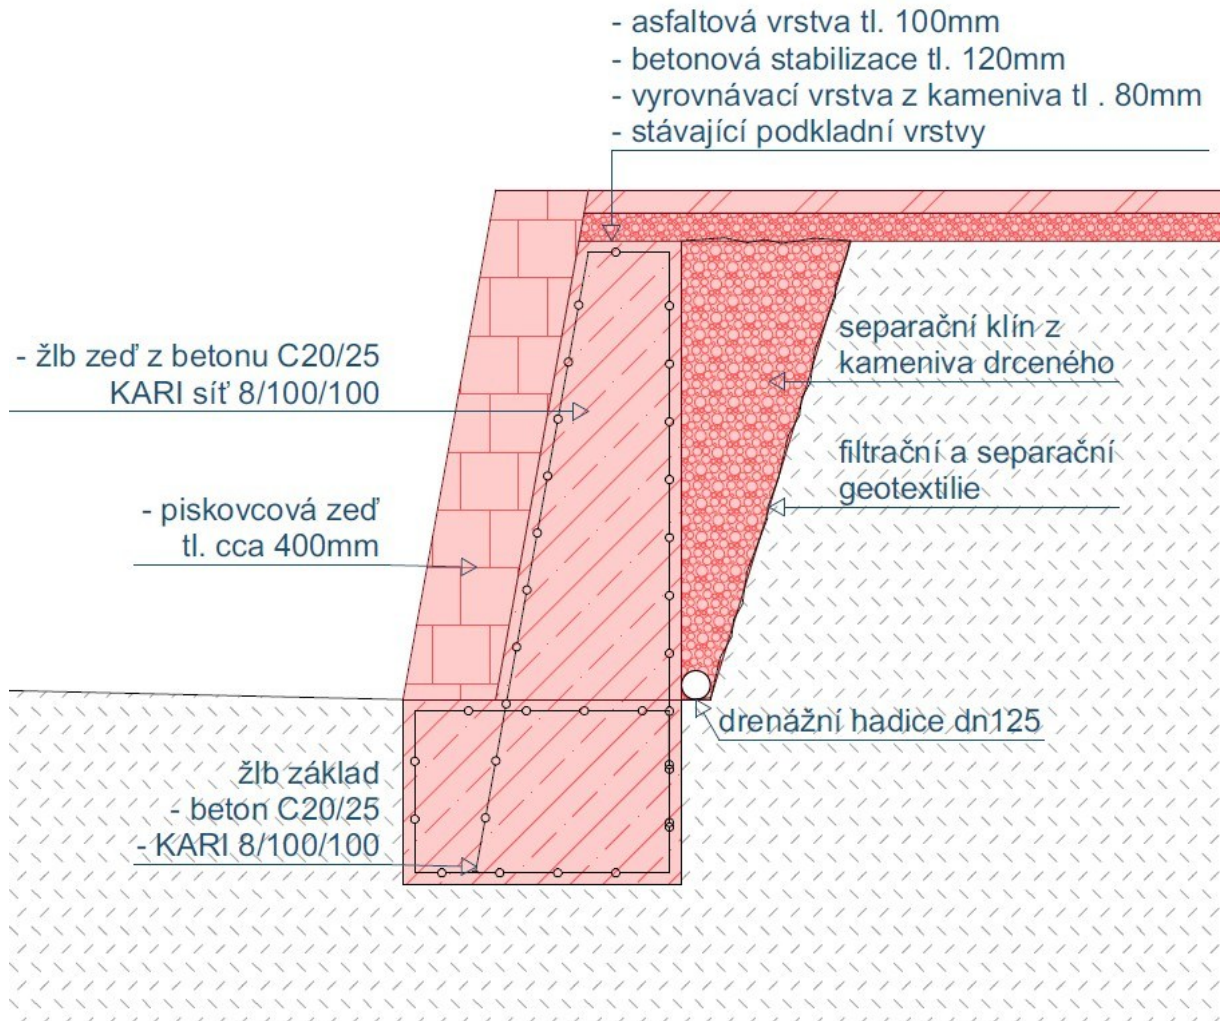

**Obr. 4** – stabilizace základové spáry v úpatí mostní konstrukce – levý břeh vodního toku Ledhujka a převedení vody z vodního toku přes staveniště potrubím KG – stav ze dne 03.10.2025



Obr. 5a, 5b – stav po dokončení opěrné zdi – 31. 10. 2025



**Obr. 6a** – stav po dokončení stavby začátkem března 2026



**Obr. 6b** – – stav po dokončení stavby začátkem března 2026
